



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL

OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: PRAÇA FELICIANO SODRÉ, N 384 – CENTRO – CASIMIRO DE ABREU – RJ.

EMOP: 06/2025

3ª MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. (C/DESCONT O)	SUB-TOTAL	QUANT. MEDIDA	% EXECUTADO	VALOR TOTAL FATURADO	SALDO
1.0		CANTEIRO DE OBRAS					803,60			R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.01	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,00	298,63	R\$ 200,90	803,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.02	02.002.0012-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA	M2	0,00	43,20	R\$ 29,07	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0		EQUIPAMENTOS					20.133,79			968,07	0,00
2.01	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	201,95	39,66	R\$ 26,68	5.388,03	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.02	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 19, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	27,15	4,60	R\$ 3,09	83,89	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.03	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	27,15	7,48	R\$ 5,03	136,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.04	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	10.317,00	0,20	R\$ 0,13	1.341,21	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.05	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	27,15	0,98	R\$ 0,65	17,65	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.06	05.105.0115-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	4,50	3.197,92	R\$ 2.151,27	9.680,71	0,45	10,00%	R\$ 968,07	R\$ 0,00
2.07	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	361,22	R\$ 242,99	485,98	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.08	05.001.0315-A	ENCARGAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERRENO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	9,00	73,98	R\$ 49,76	447,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.09	14646	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X300MM (LXC)	M	135,00	4,82	R\$ 3,24	437,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10	05.105.0102-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,66	4.762,56	R\$ 3.203,83	2.114,52	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0		REVESTIMENTOS E ALVENARIAS					22.376,05			0,00	0,00
3.1	13.348.0045-A	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 20X2CM, POLIDO, ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010	M	60,40	127,86	R\$ 86,01	5.195,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2	13.331.0020-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (90X90)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	73,00	170,86	R\$ 114,94	8.390,62	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.3	13.331.0052-A	RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO, COM 7,5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058, FEITO A PARTIR DE PLACA DE PORCELANATO COM AREA SUPERIOR A 1.00M2	M	0,00	48,71	R\$ 32,76	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.4	13.365.0025-A	SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X13CM COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.365.0010	M	25,20	107,34	R\$ 72,21	1.819,69	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.5	13.365.0010-A	REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	4,65	751,16	R\$ 505,33	2.349,78	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.6	12.016.0016-A	PAREDE DRYWALL ESP. 140MM, ESTRUT. C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM, A GUIAS HORIZONTAIS 90MM, AMBOS ACO GALV. C/ESP. 0,5MM, C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD, ESP. 12,5MM, LARG. 1200MM, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF. DA SUPERF. DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO. APLIC. EM AREAS SECAS, FORN. E COLOCACAO	M2	8,00	130,33	R\$ 87,67	701,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3.7	13.301.0131-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM	M2	24,00	46,71	R\$ 31,42	754,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.8	13.005.0010-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM	M2	16,00	67,68	R\$ 45,52	728,32	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.9	05.001.0021-A	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	M2	39,28	28,07	R\$ 18,88	741,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.10	16.022.0011-A	IMPERMEABILIZACAO C/FITA ASF.AUTO ADESIVA,RECOBERTA C/ALUM.FLEXIVEL,EM FORMAS DE TIRAS DE 5,10,15,20,30,45,90CM DE LARG.INCL.PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA ISENTO SOLVENTES,CONFORME ABNT NBR 16411.CAMPO DE APLICACAO:ELEMENTOS DE CONCRETO,TELHAS CERAMICAS OU DE FIBROCIMENTO.IMPERMEABILIZACAO UTILIZADA PARA SOLICITACOES DE PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA	M2	24,00	61,57	R\$ 41,41	993,84	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.11	13.157.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO,EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO	M2	24,00	43,47	R\$ 29,24	701,76	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.182,60			1.385,13	486,70
4.1	15.008.0085-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	360,00	4,08	R\$ 2,74	986,40	36,00	10,00%	R\$ 98,64	R\$ 0,00
4.2	18.027.0080-A	BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LED DE 4,5W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	73,81	R\$ 49,65	297,90	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 297,90
4.3	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	70,16	R\$ 47,20	283,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 188,80
4.4	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBTIDDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	12,00	361,81	R\$ 243,40	2.920,80	1,00	8,33%	R\$ 243,40	R\$ 0,00
4.5	18.027.0434-A	LUMINARIA TIPO SPOT.DIRECIONAL,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	0,00	63,13	R\$ 42,47	0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6	18.027.0098-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	45,92	R\$ 30,89	123,56	4,00	100,00%	R\$ 123,56	R\$ 0,00
4.7	05.105.0112-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,50	4.422,88	R\$ 2.975,48	4.463,22	0,30	20,00%	R\$ 892,65	R\$ 0,00
4.8	15.007.0405-A	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	0,00	134,97	R\$ 90,80	0,00	0,00	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.9	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	39,96	R\$ 26,88	107,52	1,00	25,00%	R\$ 26,88	R\$ 0,00
5.0		PINTURA					25.343,26			0,00	0,00
5.1	17.018.0080-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMA0S DE ACABAMENTO	M2	875,00	17,52	R\$ 11,78	10.307,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2	17.012.0015-A	CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPISCADA EM DUAS DEMA0S COM ADICAO DE FIXADOR	M2	216,00	15,49	R\$ 10,42	2.250,72	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3	17.017.0321-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDIC0ES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE	M2	920,00	17,91	R\$ 12,04	11.076,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4	17.017.0130-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEOBRLHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLUSIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMA0S DE ACABAMENTO,NA COR EXISTENTE	M2	131,00	19,39	R\$ 13,04	1.708,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					3.376,83			444,03	0,00
6.1	05.100.0900-0	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART.RRT,FOTOGRAFIAS,UNI FORMES,DARIAS,EXAMES ADMISIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE	UR	137,27	42,19	R\$ 24,60	3.376,83	18,05	13,15%	R\$ 444,03	R\$ 0,00
SUB-TOTAIS =							81.216,13			R\$ 2.797,23	R\$ 486,70
BDI 30% =							24.364,84			839,16	146,01
TOTAL GERAL =							105.580,97			3.636,39	632,71



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

MEMÓRIA DE CÁLCULO**OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL****LOCAL: PRAÇA FELICIANO SODRÉ, N 384 – CENTRO – CASIMIRO DE ABREU – RJ.**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	QUANT.
1.0		CANTEIRO DE OBRAS		
1.01	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,00

Item 100% medido

2.0		EQUIPAMENTOS		
2.01	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	0,00

Item 100% medido

2.02	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	0,00
------	---------------	--	----	------

Item 100% medido

2.03	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	0,00
------	---------------	--	----	------

Item 100% medido

2.04	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	0,00
------	---------------	--	-------	------

Item 100% medido

2.05	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	0,00
------	---------------	--	----	------

Item 100% medido

2.06	05.105.0154-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,45
------	---------------	--	-----	------

Período Quant. Total
4,5 dias de 3 serventes = 0,15 x 3,00 = 0,45

2.07	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	0,00
------	---------------	---	----	------

Item 100% medido

2.08	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	0,00
------	---------------	---	----	------

Item 100% medido

2.09	14646	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO,PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC)	M	0,00
------	-------	--	---	------

Item 100% medido

2.10	05.105.0102-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,00
------	---------------	---	-----	------

Item 100% medido

3.0		REVESTIMENTO		
3.1	13.348.0045-A	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010	M	0,00

Item 100% medido

3.2	13.331.0020-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (90X90)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	0,00
-----	---------------	--	----	------

Item 100% medido

3.4	13.365.0025-A	SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X13CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010	M	0,00
-----	---------------	--	---	------

Item 100% medido

3.5	13.365.0010-A	REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	0,00
-----	---------------	--	----	------

Item 100% medido

3.6	12.016.0016-A	PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO	M2	0,00
-----	---------------	---	----	------

Item 100% medido

3.7	13.301.0131-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM	M2	0,00
-----	---------------	--	----	------

Item 100% medido

3.8	13.005.0010-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM	M2	0,00
-----	---------------	--	----	------

Item 100% medido

3.9	05.001.0021-A	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	M2	0,00
-----	---------------	--	----	------

Item 100% medido

3.10	16.022.0011-A	IMPERMEABILIZACAO C/FITA ASF.AUTO ADESIVA,RECOBERTA C/ALUM.FLEXIVEL,EM FORMAS DE TIRAS DE 5,10,15,20,30,45,90CM DE LARG.INCL.PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA ISENTO SOLVENTES,CONFORME ABNT NBR 16411.CAMPO DE APLICACAO:ELEMENTOS DE CONCRETO,TELHAS CERAMICAS OU DE FIBROCIMENTO.IMPERMEABILIZACAO UTILIZADA PARA SOLICITACOES DE PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA	M2	0,00
------	---------------	---	----	------

Item 100% medido

3.11	13.157.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO,EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO	M2	0,00
------	---------------	---	----	------

Item 100% medido

4.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	15.008.0085-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDOR:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	36,00

Alimentação de luminárias e refletor até o quadro elétrico = 36,00

4.2	18.027.0080-A	BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LED DE 4,5W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	0,00
-----	---------------	---	----	------

NÃO HOUE EXECUÇÃO DESTE ITEM

4.3	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	0,00
-----	---------------	---	----	------

NÃO HOUE EXECUÇÃO DESTE ITEM

4.4	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	1,00
-----	---------------	---	----	------

Luminárias fachada = 1,00

4.6	18.027.0098-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
-----	---------------	---	----	------

Iluminação do estacionamento = 4,00

4.7	05.105.0112-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,30
-----	---------------	---	-----	------

Mão de obra para uma revisão na elétrica = 0,30

4.9	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
-----	---------------	--	----	------

Para iluminação = 1,00

5.0		PINTURA		
------------	--	----------------	--	--

5.1	17.018.0080-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	0,00
-----	---------------	---	----	------

Item 100% medido

5.2	17.012.0015-A	CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPISCADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR	M2	0,00
-----	---------------	---	----	------

Item 100% medido

5.3	17.017.0321-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDIC0ES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE	M2	0,00
-----	---------------	---	----	------

Item 100% medido

5.4	17.017.0130-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEOBRLHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLUSIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR EXISTENTE	M2	0,00
-----	---------------	--	----	------

Item 100% medido

6.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	05.100.0900-0	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE	UR	18,05



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASIMIRO DE ABREU**

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: PRAÇA FELICIANO SODRÉ, N 384 – CENTRO – CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (Sessenta) dias				1a. MED.	%	2a. MED.	%	3ª. MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		15 DIAS	15 DIAS
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	803,60	0,9895%	803,60	0,990%	0,00	0,000%	0,00	0,000%		
2.0	EQUIPAMENTOS	20.133,79	24,7904%	3.083,47	3,797%	16.082,25	19,802%	968,07	1,192%		
3.0	REVESTIMENTOS E ALVENARIAS	22.376,05	27,5512%	13.240,25	16,302%	9.135,80	11,249%	0,00	0,000%		
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.182,60	11,3064%	2.100,88	2,587%	5.209,89	6,415%	1.385,13	1,705%		
5.0	PINTURA	25.343,26	31,2047%	11.394,71	14,030%	13.948,55	17,175%	0,00	0,000%		
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.376,83	4,1578%	1.611,79	1,985%	1.321,01	1,627%	444,03	0,547%		
	CUSTOS DIRETOS	R\$ 81.216,13	100,000%	R\$ 32.234,70	39,690%	R\$ 45.697,49	56,267%	R\$ 2.797,23	3,444%		
	BDI 30,00%	R\$ 24.364,84		R\$ 9.670,40		R\$ 13.709,26		R\$ 839,16			
	TOTAL	R\$ 105.580,97	100,000%	R\$ 41.905,10	39,690%	R\$ 59.406,75	56,267%	R\$ 3.636,39	3,444%		
	ACUMULADO	R\$ 105.580,97	100,000%	R\$ 41.905,10	39,690%	R\$ 101.311,85	95,957%	R\$ 104.948,23	99,401%		

Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL MIGUEL ARAUJO MESSIAS
Data: 27/03/2026 13:31:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Prestação de serviços comuns de engenharia para execução de pequenas reformas, com o fornecimento de materiais e mão de obra, a fim de realizar melhorias e manutenção no prédio sede da Câmara municipal de Casimiro de Abreu.

CONTRATO

PROCESSO

014/2025


929317/2025

PERÍODO: 27/01/2026 a 12/02/2026

Ref. 3ª Medição



INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ

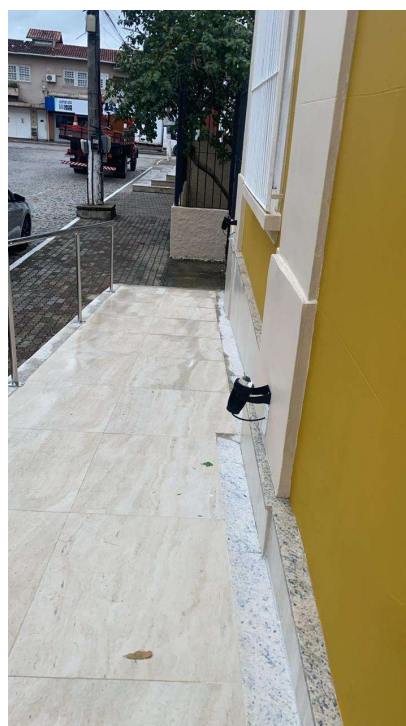


INSTALAÇÃO DE ARANDELAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Prestação de serviços comuns de engenharia para execução de pequenas reformas, com o fornecimento de materiais e mão de obra, a fim de realizar melhorias e manutenção no prédio sede da Câmara municipal de Casimiro de Abreu.	CONTRATO	PROCESSO
	014/2025	929317/2025
PERÍODO: 27/01/2026 a 12/02/2026	Ref. 3ª Medição	



INSTALAÇÃO DE REFLETORES

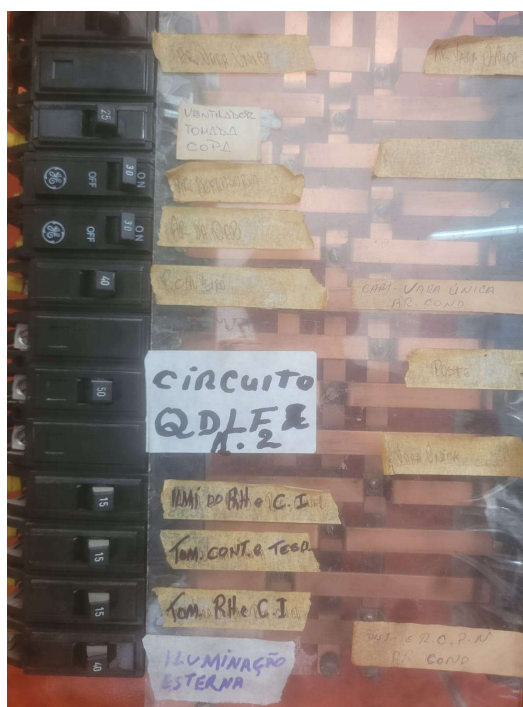

INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Prestação de serviços comuns de engenharia para execução de pequenas reformas, com o fornecimento de materiais e mão de obra, a fim de realizar melhorias e manutenção no prédio sede da Câmara municipal de Casimiro de Abreu.

CONTRATO


PROCESSO

014/2025

929317/2025

PERÍODO: 27/01/2026 a 12/02/2026

Ref. 3ª Medição

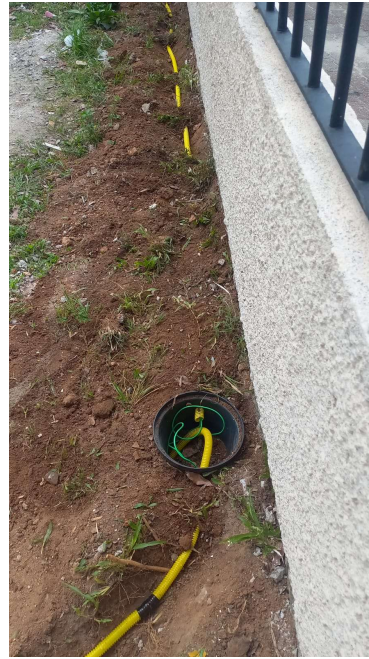

INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO



Documento assinado digitalmente

RAFAEL MIGUEL ARAUJO MESSIAS

Data: 27/03/2026 13:31:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ.

PARECER DO FISCAL DO CONTRATO

Processo Administrativo nº 1209/2025

Contrato nº 014/2025

Empresa: **Lidera Construção e Serviços de Paisagismo LTDA**

CNPJ nº **55.949.187/0001-96**

O Fiscal do Contrato nº 014/2025 e 1º Termo Aditivo, no uso de suas atribuições legais e contratuais, vem, por meio do presente, **atestar** que os serviços descritos na **medição da obra**, na **memória de cálculo** e no **cronograma financeiro**, referentes à execução do objeto contratual, foram **devidamente prestados em conformidade com as cláusulas e condições estabelecidas no contrato** firmado com a empresa **Lidera Construção e Serviços de Paisagismo Ltda.**

O objeto do referido contrato consiste na **prestação de serviços comuns de engenharia para execução de pequenas reformas, com fornecimento de materiais e mão de obra, visando melhorias e manutenção no prédio-sede da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu**, os quais foram executados de acordo com as especificações técnicas, quantitativos previstos e prazos estabelecidos.

Após análise técnica da documentação apresentada, bem como verificação in loco dos serviços executados, constata-se que **não há pendências ou irregularidades** quanto à execução contratual correspondente à presente medição.

Dessa forma, **atesto a regularidade da execução dos serviços** e a conformidade da **Nota Fiscal nº 10**, no valor total de **R\$ 3.636,39** (Três mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), encontrando-se apta para fins de liquidação e pagamento, observadas as demais exigências legais e administrativas pertinentes.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Casimiro de Abreu, 30 de março de 2026.

FELIPE PASCHOAL LINHARES
MAT. 643

Documento assinado digitalmente



RAFAEL MIGUEL ARAÚJO MESSIAS

Data: 30/03/2026 12:41:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL MIGUEL ARAÚJO MESSIAS
MAT. 14196

THIAGO FABIANO JARDIM MAURINO
MAT.689





CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

RUA FELICIANO SODRE, Nº 384 - CENTRO - CNPJ: 30.407.084/0001-43

CASIMIRO DE ABREU/RJ - CEP 28.860-000

FONE: (22) 2778-1183



CÓDIGO DE ACESSO

7726FF5F276445358F53325141E0C636

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FELIPE PASCHOAL LINHARES em 30/03/2026 13:02:37
CPF:***.***-.497-35
Certificadora: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - ROOT
- ✓ Assinante: THIAGO FABIANO JARDIM MAURINO em 30/03/2026 14:43:27
CPF:***.***-.167-77
Certificadora: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cmcasimirodeabreu.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/7726FF5F276445358F53325141E0C636>



Chave de Acesso da NFS-e

3301306225594918700016600000000001026038797543110

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
03/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/03/2026 06:28:23

Número da DPS
22

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
16/03/2026 06:28:23



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

55.949.187/0001-66

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LIDERA CONSTRUCAO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA

E-mail

-

Endereço

PADRE FRANCISCO MARIA TALLES, 903, VILA MATARUNA

Município

Casimiro de Abreu - RJ

CEP

28860-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.407.084/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CAMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

E-mail

-

Endereço

FELICIANO SODRE, 384, EDIF ANTIGO FORUM, CENTRO

Município

Casimiro de Abreu - RJ

CEP

28860-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Casimiro de Abreu - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PEQUENAS REFORMAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR MELHORIAS E MANUTENÇÕES NO PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU.

3ª Medição

Contrato Administrativo nº 014/2025

Nota de Empenho: 356

Valor total: R\$ 3.636,39

Materiais: R\$ 2.727,29

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Casimiro de Abreu - RJ

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.636,39

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 3.636,39

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 181,82

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.636,39

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 181,82

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.454,57

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PEQUENAS REFORMAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR MELHORIAS E MANUTENÇÕES NO PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU; 3ª Medição; Contrato Administrativo nº 014/2025; Nota de Empenho: 356; Valor total: R\$ 3.636,39; Materiais: R\$ 2.727,29; Mão de obra: R\$ 909,1 INSS: 11% R\$ 100,00; Dados Bancarios; Banco Bradesco: 237; Agência: 883; Conta Corrente: 65.415-9; LIDERA CONSTRUGAO E SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA. | NBS: 101073000

Processo 1209/2025. Assinado por 2 pessoas: FELIPE PASCHOAL LINHARES e THIAGO FABIANO JARDIM MAURINO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://cmcasimirodeabreu.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/C81604C92BD6421DA9FD13F30CE70199>





CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

RUA FELICIANO SODRE, Nº 384 - CENTRO - CNPJ: 30.407.084/0001-43

CASIMIRO DE ABREU/RJ - CEP 28.860-000

FONE: (22) 2778-1183



CÓDIGO DE ACESSO

C81604C92BD6421DA9FD13F30CE70199

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: FELIPE PASCHOAL LINHARES em 30/03/2026 12:56:46
CPF:***.***-.497-35
Certificadora: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - ROOT
- ✓ Assinante: THIAGO FABIANO JARDIM MAURINO em 30/03/2026 14:43:02
CPF:***.***-.167-77
Certificadora: CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://cmcasimirodeabreu.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/C81604C92BD6421DA9FD13F30CE70199>



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

CÂMARA MUNICIPAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa LIDERA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA, com sede na RUA PADRE FRANCISCO MARIA TALLES, Nº 903, VILA MATARUNA – CASIMIRO DE ABREU-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 55.949.187/0001-66, tendo como responsável técnico o engenheiro civil ECKEL PEREIRA COELHO, CREA-RJ Nº 2016120855 -RJ – ART Nº 2020260017045, 2020250366806 ,2020260074580 executou para a Câmara Municipal de Casimiro de Abreu, com sede na PRAÇA FELICIANO SODRÉ, Nº: 384, Centro, CEP: 28860000 - Cidade CASIMIRO DE ABREU RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 30.407.084/0001-43, satisfatoriamente e dentro dos prazos e especificações estabelecidos através do CONTRATO Nº. 14/2025, a Obra de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PEQUENAS REFORMAS COM A FINALIDADE DE REALIZAR MELHORIAS E MANUTENÇÕES NO PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU. Objeto realizado no período de 24/11/2025 à 02/03/2026, perfazendo o valor total de R\$ 105.580,98 (CENTO E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVENTA E OITO CENTAVOS.) com os seguintes serviços

OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: PRAÇA FELICIANO SODRÉ, N 384 – CENTRO – CASIMIRO DE ABREU – RJ.

EMOP: 06/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.	QUANT.
1.0		CANTEIRO DE OBRAS		
1.01	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	4,00
2.0		EQUIPAMENTOS		
2.01	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	201,95
2.02	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	27,15
2.03	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	27,15
2.04	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	10.317,00
2.05	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	27,15
2.06	05.105.0115-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	4,50
2.07	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00
2.08	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	9,00
2.09	14646	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, ESP=0,5MM, 48X3000MM (LXC)	M	135,00
2.10	05.105.0102-A	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	0,66
3.0		REVESTIMENTOS E ALVENARIAS		
3.1	13.348.0045-A	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 20X2CM, POLIDO, ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010	M	60,40
3.2	13.331.0020-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (90X90)CM, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO, CONFORME ABNT NBR ISO 13006, ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	M2	73,00
3.4	13.365.0025-A	SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 2X13CM COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.365.0010	M	25,20
3.5	13.365.0010-A	REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 2CM, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE	M2	4,65

3.6	12.016.0016-A	PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS,FORN.E COLOCACAO	M2	8,00
3.7	13.301.0131-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM	M2	24,00
3.8	13.005.0010-A	REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM	M2	16,00
3.9	05.001.0021-A	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	M2	39,28
3.10	16.022.0011-A	IMPERMEABILIZACAO C/FITA ASF.AUTO ADESIVA,RECOBERTA C/ALUM.FLEXIVEL,EM FORMAS DE TIRAS DE 5,10,15,20,30,45,90CM DE LARG.INCL.PRIMER ASFALTICO A BASE DE AGUA ISENTO SOLVENTES,CONFORME ABNT NBR 16411.CAMPO DE APLICACAO:ELEMENTOS DE CONCRETO,TELHAS CERAMICAS OU DE FIBROCIMENTO.IMPERMEABILIZACAO UTILIZADA PARA SOLICITACOES DE PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA	M2	24,00
3.11	13.157.0010-A	REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO,EM MANTA DE LA DE VIDRO REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO	M2	24,00
4.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	15.008.0085-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDEDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	360,00
4.3	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
4.4	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA	UN	12,00
4.6	18.027.0098-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
4.7	05.105.0112-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	MES	1,50
4.9	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00
5.0		PINTURA		
5.1	17.018.0080-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	875,00
5.2	17.012.0015-A	CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPISCADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR	M2	216,00
5.3	17.017.0321-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDIC0ES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE	M2	920,00
5.4	17.017.0130-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEOBRLHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLUSIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR EXISTENTE	M2	131,00
6.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
6.1	05.100.0900-0	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISS0NAIS,PERIODICOS E DEMISS0NAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE	UR	137,27

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado

Casimiro de Abreu, 13 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
 **RAFAEL MIGUEL ARAUJO MESSIAS**
Data: 27/03/2026 13:31:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
